

Mapeamento do Processo AS-IS — Planejamento de Contratações e Orçamento do CBMDF

Documento de análise incorporado à documentação do projeto. Descreve, com base nas normas internas vigentes, **como o CBMDF hoje planeja, orça e formaliza suas contratações** — antes de qualquer intervenção do CBMDF Marketplace. Serve de base factual para o Documento de Visão e para futuros desenhos de processo TO-BE.

1. Objetivo e fontes normativas

Este documento mapeia o processo **AS-IS** (como é hoje) do ciclo de planejamento de contratações e orçamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a partir de três fontes primárias disponíveis em [docs/processo_as_is/](#):

Fonte	Instrumento	O que regula
PORTARIA_PCA.pdf	Portaria nº 18, de 30/06/2025	Elaboração, aprovação, revisão, alteração, execução e monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA)
Suplemento_ao_BG_120_..._Portaria_n_17_2025_PARF_POA.pdf	Portaria nº 17, de 30/06/2025 (revoga a Portaria nº 21/2020)	Elaboração e aprovação do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros (PARF) e elaboração da Proposta Orçamentária Anual (POA/PLOA)
Suplemento-204-29out2025.pdf	Portaria nº 34, de 28/10/2025	Exemplo real de saída do processo: aprovação da 4ª versão do PARF/2025, com


Fonte	Instrumento	O que regula
		planilha anexa de demandas de todos os órgãos setoriais


Cada afirmação de prazo, papel ou regra abaixo é rastreável a um artigo específico de uma dessas portarias, citado entre parênteses.


2. Visão geral: os três ciclos encadeados

O processo é sequencial e cumulativo dentro de um mesmo exercício de planejamento (ano N para execução em N+1):

1. **PCA** — consolida *o que* a Corporação pretende contratar (bens, serviços, obras, TI, prorrogações) no exercício subsequente (Portaria nº 18, Art. 2º, 7º).
2. **PARF** — a partir do PCA já aprovado, soma as despesas de **pessoal e custeio da folha** e consolida *quanto* isso custa, em 3 versões sucessivas ao longo do ano (Portaria nº 17, Art. 2º, 6º).
3. **POA/PLOA** — usa o PCA + a 1ª versão do PARF + a previsão de receitas para compor a **proposta orçamentária** que o CBMDF envia ao órgão consolidador da Lei Orçamentária Anual (Portaria nº 17, Art. 1º, 7º-11º).



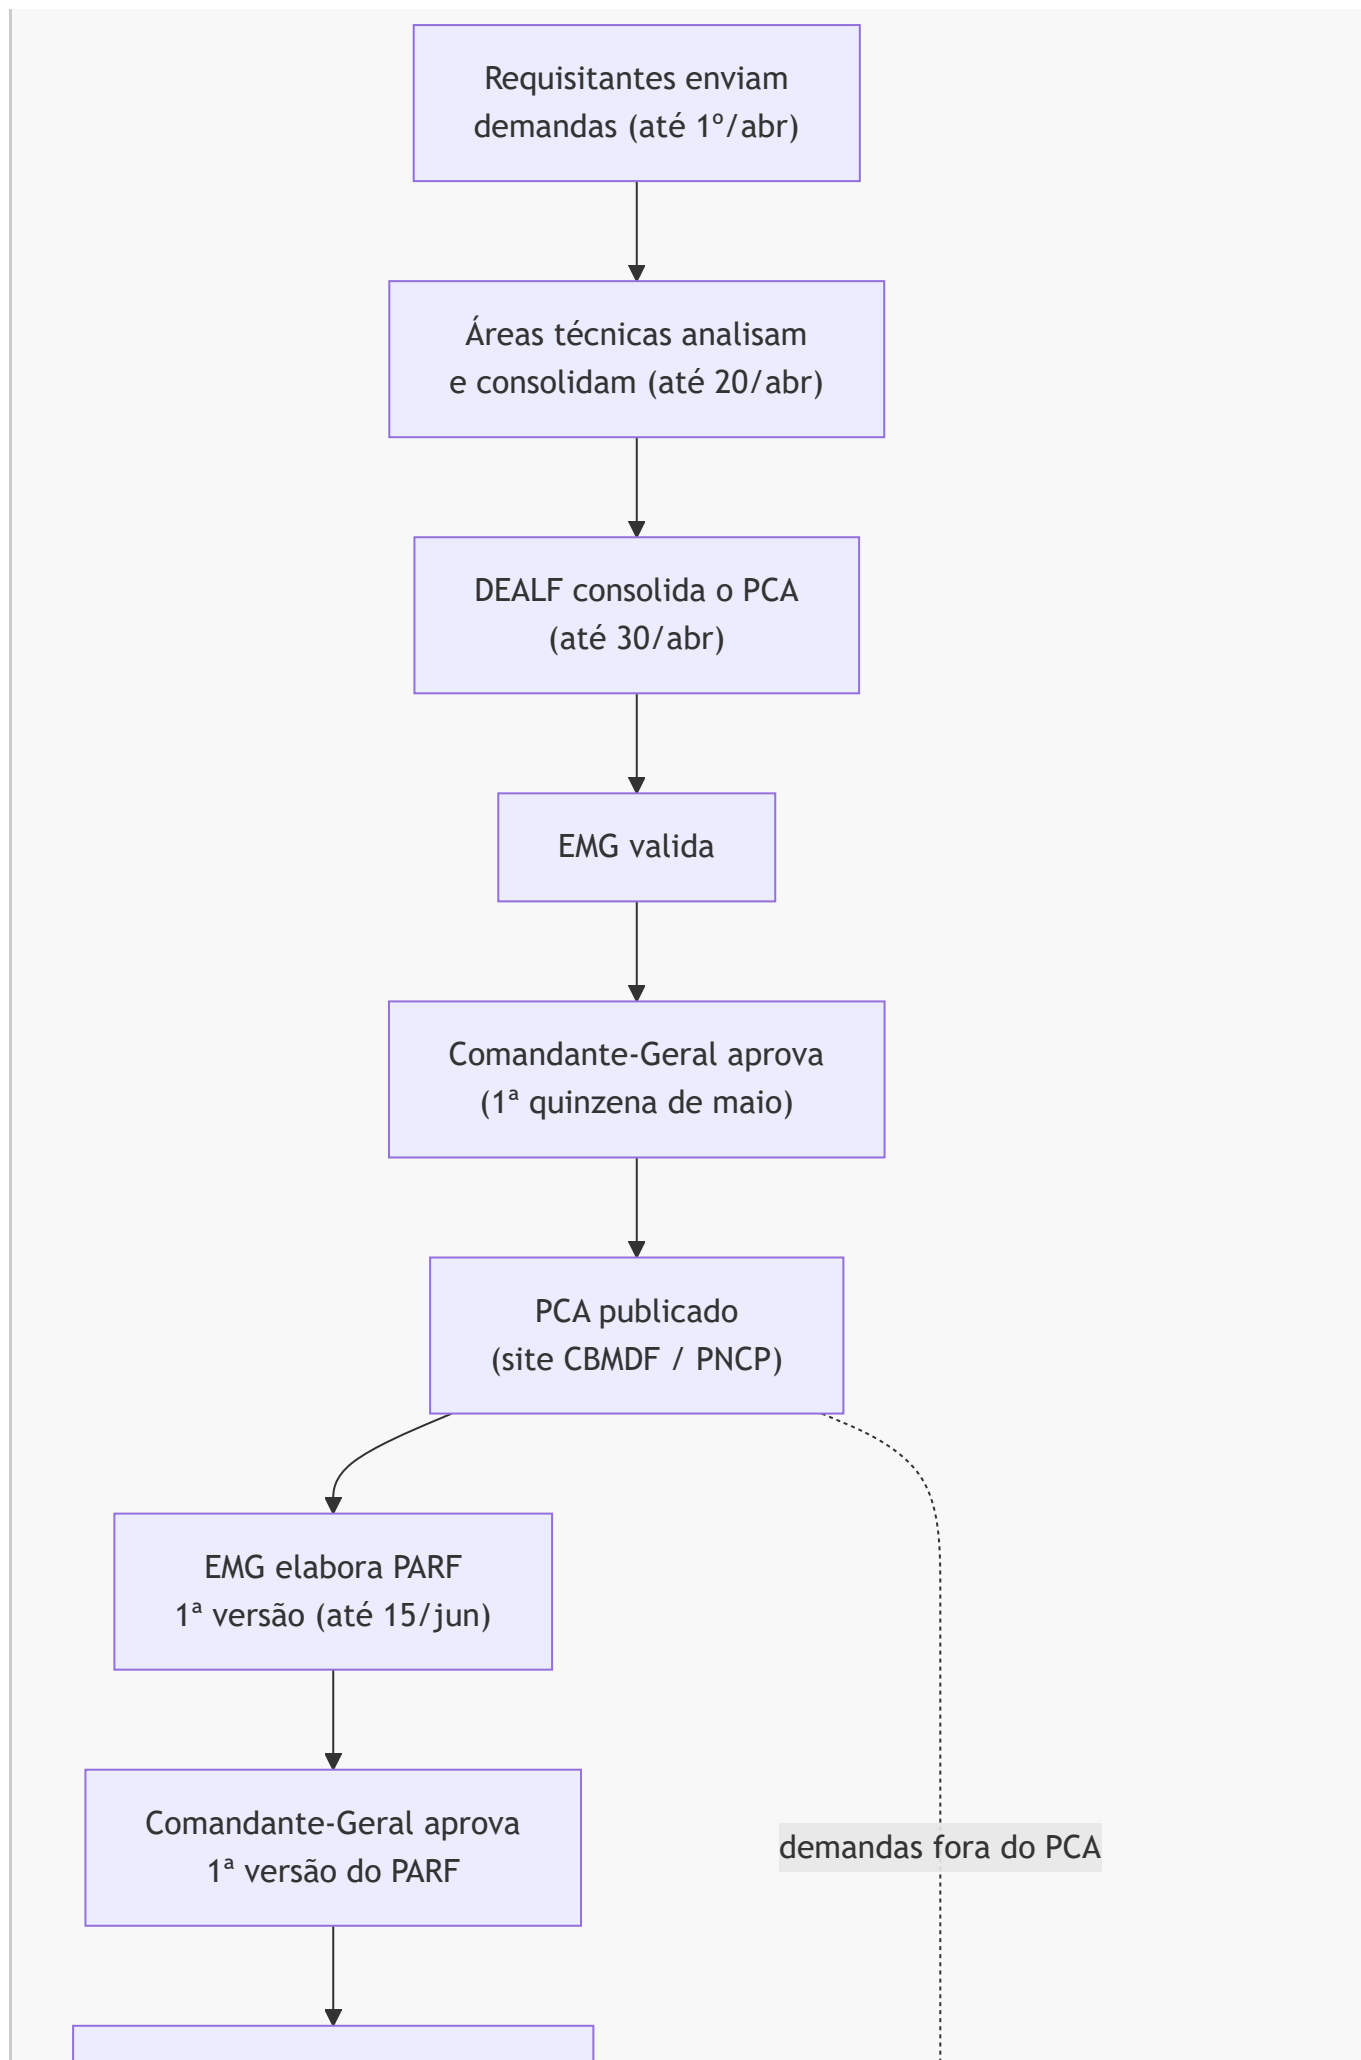

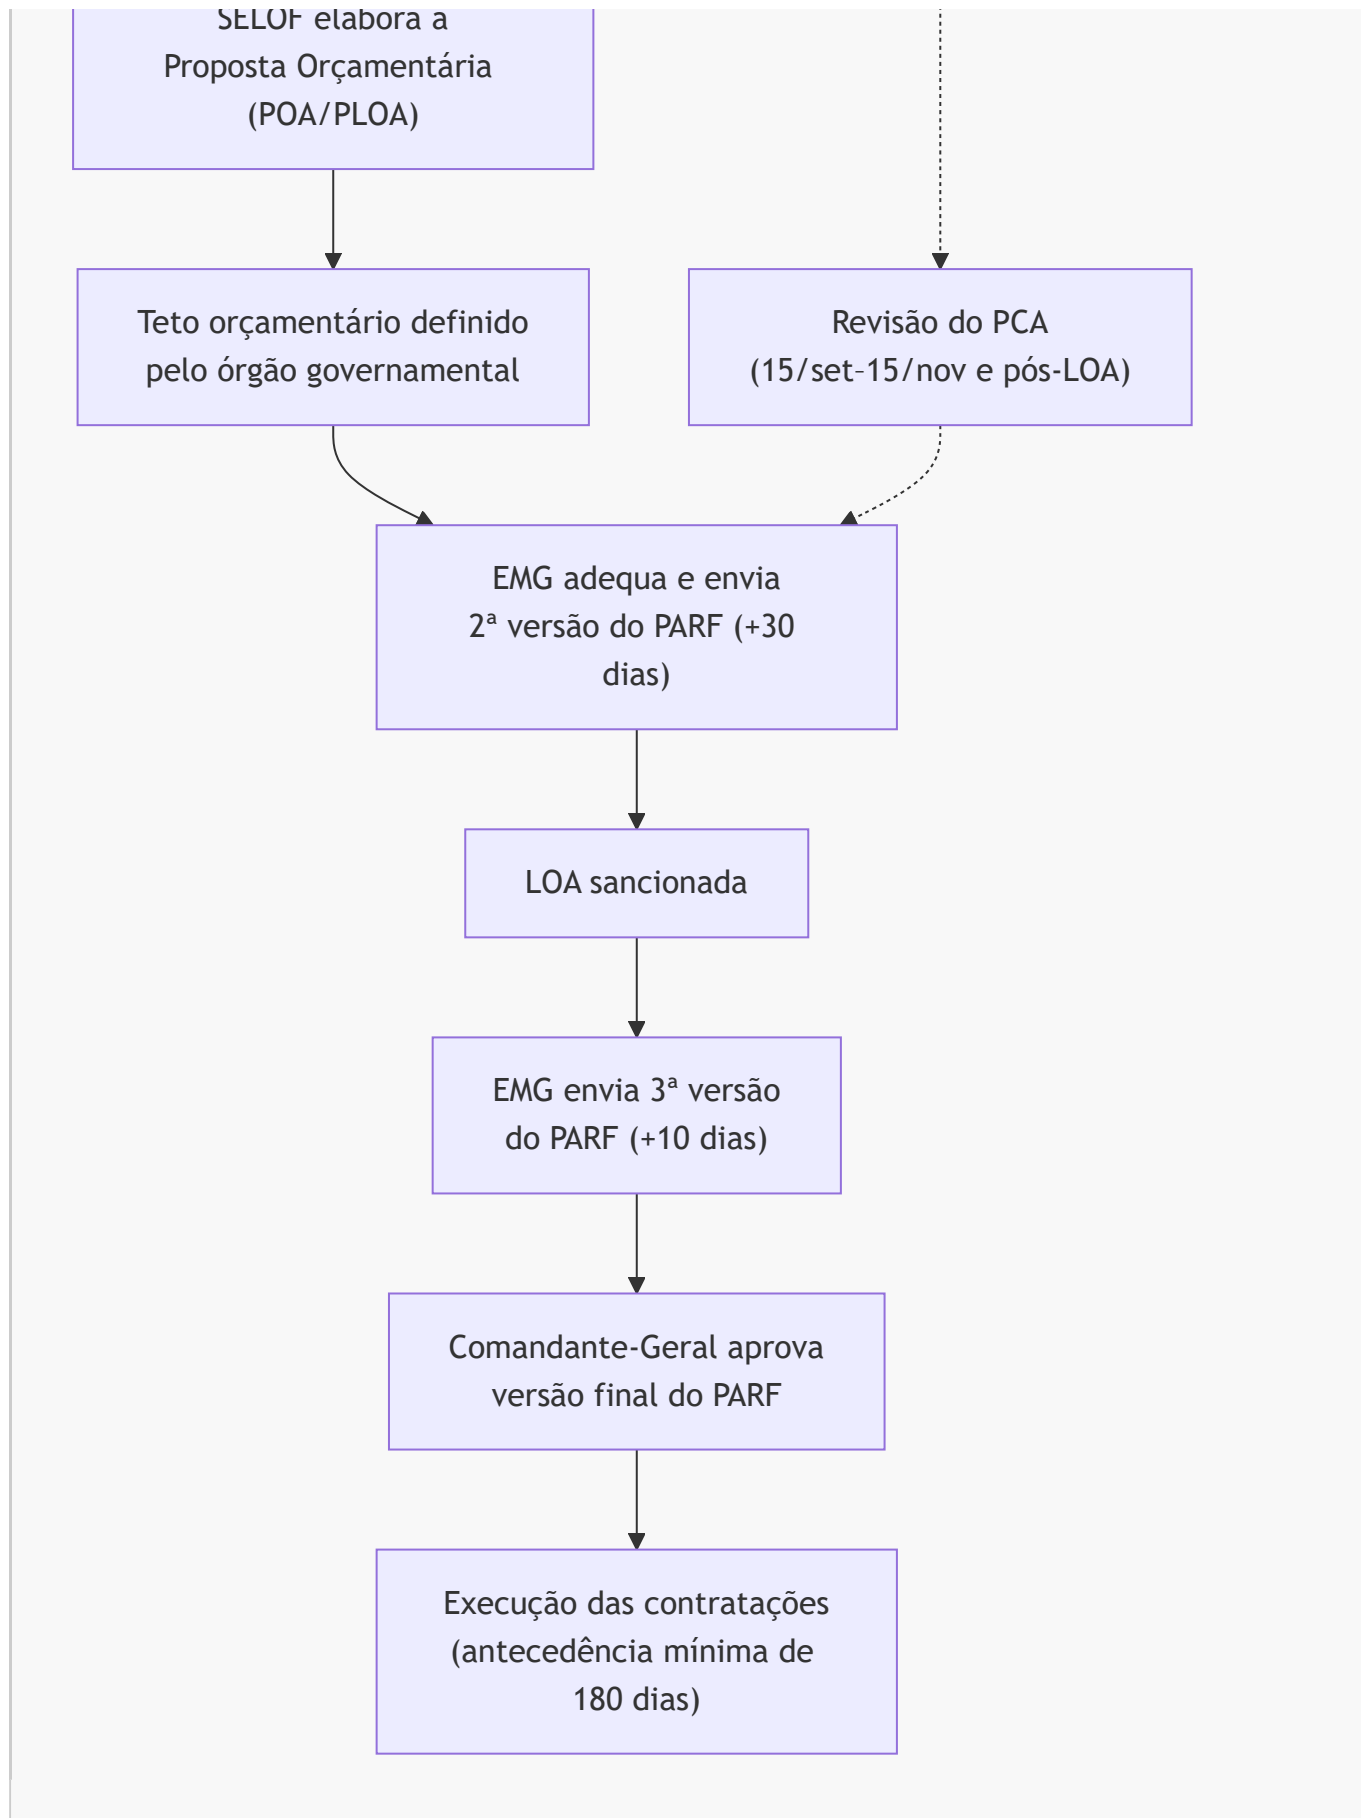

3. Papéis e responsabilidades

Papel / Sigla	Quem é	Responsabilidade principal	Base legal
Requisitante	Setor/OBM que identifica a necessidade	Envia a demanda (DFD) até 1º de abril, com justificativa, quantidade, valor estimado, prioridade e vínculos	Art. 4º, XIV e Art. 9º (Portaria 18)
Área técnica	COMOP, DITIC, DIREN, DISAU, DIMAT	Recebe, analisa, agrupa e padroniza as demandas de sua área; pode reclassificar/incluir/excluir itens	Art. 5º e 11 (Portaria 18)
DEALF	Departamento de Administração Logística e Financeira	Gestor do PCA — elabora e consolida o PCA da Corporação	Art. 3º (Portaria 18)
EMG	Estado-Maior-Geral	Coordenador do PCA; Coordenador e Gestor do PARF — valida o PCA, elabora o PARF e a Proposta Orçamentária	Art. 3º (Portaria 18); Art. 3º (Portaria 17)
Comandante-Geral	Autoridade máxima	Aprova o PCA, aprova (via Portaria) cada versão do PARF, decide sobre alterações extraordinárias	Art. 14-15 (Portaria 18); Art. 12-15 (Portaria 17)
DICOA	Diretoria de Contratações e Aquisições	Recebe os processos de contratação já instruídos para dar seguimento à licitação	Art. 13, §1º; Art. 20, §1º (Portaria 18)
DIMAT	Diretoria de Materiais e Serviços	Analisa aspectos formais dos processos, elabora TR/Projeto Básico, pode agrupar processos afins	Art. 23-24 (Portaria 18)
SELOF	Seção de Logística, Orçamento e Finanças (dentro do EMG)	Elabora, na prática, a Proposta Orçamentária Anual	Art. 8º (Portaria 17)
DIOFI	Diretoria de Orçamento e Finanças	Fornece dados de execução orçamentária, GSV, reservas de contingência	Art. 6º §2º III; Art. 8º; Art. 18 (Portaria 17)
DIGEP	Diretoria de Gestão de Pessoal	Fornece dados de folha do pessoal ativo e receitas de identidades	Art. 6º §2º I; Art. 10 (Portaria 17)
DINAP	Diretoria de Inativos e Pensionistas	Fornece dados de folha de inativos/pensionistas, PTTC/PTTD	Art. 6º §2º II (Portaria 17)
SEGEF	Seção de Gestão Estratégica e Projetos (dentro do EMG)	Assessora a indicação de gerentes de projetos estratégicos	Art. 25 (Portaria 18)

Papel / Sigla	Quem é	Responsabilidade principal	Base legal
Gerente de projeto	Indicado pela área técnica	Acompanha e impulsiona projetos estratégicos ou financiados por emendas parlamentares/recursos externos	Art. 25-27 (Portaria 18)

4. Fluxo detalhado do PCA (Plano de Contratações Anual)

O PCA é o instrumento que **consolida todas as contratações que o CBMDF pretende realizar no exercício seguinte** — compras, obras, serviços (inclusive TI e engenharia), prorrogações contratuais e contratações diretas dos Art. 74/75 da Lei 14.133/2021 (Art. 2º, 7º, 8º).

4.1 Cronograma anual (Anexo Único, Portaria 18)

Período	Etapa	Artigo
Até 1º de abril	Requisitantes enviam demandas às áreas técnicas por instrumento padronizado	Art. 9º
Até 20 de abril	Áreas técnicas analisam, agrupam e encaminham as demandas ao DEALF	Art. 11, §3º
Até 30 de abril	DEALF consolida o PCA e envia ao EMG para validação	Art. 13, §3º
Até a 1ª quinzena de maio	Comandante-Geral aprova o PCA	Art. 15
Até a 1ª quinzena de maio	Divulgação no site do CBMDF e, quando aplicável, no PNCP	Art. 15, § único
15 de setembro a 15 de novembro	Revisão do PCA para adequação à proposta orçamentária enviada ao Legislativo	Art. 16, I
Quinzena seguinte à publicação da LOA	Adequação do PCA ao orçamento aprovado	Art. 16, II
Durante o ano de execução	Alteração do PCA mediante justificativa aprovada pelo Comandante-Geral	Art. 17
Antecedência mínima de 180 dias (120 dias para ensino)	Formalização e impulsionamento dos processos de contratação	Art. 20, §3º
A partir de julho	Elaboração de relatórios de risco sobre contratações que podem não se efetivar	Art. 21
Julho, setembro e novembro	Apresentação bimestral dos relatórios de risco em reunião	Art. 21, §2º

4.2 Da demanda à consolidação

- Envio da demanda (DFD):** cada requisitante formaliza a necessidade por instrumento padronizado, informando justificativa, descrição, quantidade, valor estimado, data pretendida, grau de prioridade e

eventuais vínculos com outras demandas (Art. 9º). O requisitante deve observar, no mínimo, a classe/grupo do catálogo eletrônico de padronização indicado pelo DEALF (Art. 9º, §2º).

2. **Análise pela área técnica:** a área técnica recebe as demandas de todas as OBMs, analisa necessidade/viabilidade e as agrupa para evitar fracionamento de despesa e repetição (Art. 11). Pode reclassificar, incluir ou retirar itens, com justificativa (Art. 11, §2º).
3. **Consolidação pelo DEALF:** agrega documentos de mesma natureza, adequa o PCA aos objetivos do Art. 6º e monta o **calendário de contratação** por grau de prioridade, considerando disponibilidade orçamentária e financeira (Art. 13). O calendário já define o prazo de tramitação até a DICOA.
4. **Validação pelo EMG e decisão do Comandante-Geral:** o EMG pode reprovar itens ou devolver o PCA ao DEALF para ajustes; itens inviáveis vão para um **banco de projetos** para consulta futura (Art. 14). O Comandante-Geral aprova até a 1ª quinzena de maio (Art. 15).
5. **Divulgação:** o PCA aprovado é publicado no site do CBMDF e, quando houver acesso, no PGC/PNCP (Art. 15, § único).

4.3 Exceções — dispensadas de registro no PCA (Art. 12)

- Informações sigilosas (Lei nº 12.527/2011 e outras hipóteses legais de sigilo);
- Contratações via suprimento de fundos (Decreto nº 93.872/1986, Art. 45);
- Hipóteses dos incisos VI, VII e VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021;
- Pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento (Lei nº 14.133/2021, Art. 95, §2º).

4.4 Execução e monitoramento

- As demandas constantes do PCA são **previamente aprovadas** para fins de instauração dos processos de contratação (Art. 20). A formalização segue a **ordem de prioridade** do calendário, respeitando **180 dias de antecedência mínima** (120 dias para demandas de ensino) em relação à data estimada da contratação (Art. 20, §3º).
- Se a demanda não constar do PCA, o requisitante deve justificar urgência/necessidade (Art. 19, §1º), o que pode ensejar revisão do plano (Art. 19, §2º).
- A partir de julho, as áreas técnicas produzem **relatórios de gestão de risco** sobre a provável não efetivação de itens do PCA, apresentados bimestralmente (jul/set/nov) em reunião com Gestor e Coordenador do PCA e titulares das áreas técnicas (Art. 21). Ao fim do exercício, contratações não realizadas são justificadas e, se ainda necessárias, incorporadas ao PCA do ano seguinte (Art. 21, §4º).
- O processamento formal segue: **DIMAT** analisa inconsistências e elabora TR/Projeto Básico → encaminha à **DICOA** para a fase de licitação propriamente dita (Art. 22-24). Projetos estratégicos ou financiados por emendas parlamentares/recursos externos exigem **gerente de projeto** indicado pela área técnica (Art. 25-27).

5. Fluxo detalhado do PARF e da Proposta Orçamentária (POA/PLOA)

O PARF é um **instrumento de gestão e governança** que reúne o PCA aprovado + as despesas de pessoal e custeio da folha do exercício, sendo composto por **três versões sucessivas** (Portaria 17, Art. 2º).

5.1 Cronograma anual (Anexo Único, Portaria 17)

Período	Etapa	Artigo
Após aprovação do PCA pelo Comandante-Geral	Elaboração do PARF com base no PCA e nos gastos com pessoal	Art. 6º
—	DIGEP, DINAP e DIOFI expedem as informações de gastos de folha (ativos, inativos/pensionistas, GSV)	Art. 6º, §2º
Após publicação da LDO / cronograma da LOA	Início das reuniões técnicas do EMG para a estrutura da POA	Art. 7º
Até 30 de abril	DIOFI e DISAU enviam relatório de desempenho da execução orçamentária do ano anterior	Art. 8º, § único
Até 15 de junho do ano anterior à execução	EMG envia a 1ª versão do PARF ao Comandante-Geral para aprovação	Art. 12
Conforme cronograma da LOA	SELOF fecha e envia a Proposta Orçamentária (POA/PLOA) ao Comandante-Geral	Art. 11
Até 5 dias após o envio do EMG	Comandante-Geral se manifesta sobre a Proposta Orçamentária	Art. 11, § único
Até 30 dias após definição do teto orçamentário	EMG adequa e envia a 2ª versão do PARF	Art. 13
Até 10 dias após publicação da LOA (União ou DF, o que ocorrer por último)	EMG envia a 3ª versão do PARF	Art. 14
Até 5 dias após o envio do EMG	Comandante-Geral aprova (ou devolve para ajustes) cada versão do PARF, por Portaria	Art. 15
Periódico	Reavaliação do PARF em reuniões coordenadas pelo Chefe do EMG	Art. 20

A Portaria nº 34/2025 (Suplemento 204) é o registro concreto desse ciclo: aprova a **4ª versão** do PARF/2025 — ou seja, na prática o processo já extrapolou as 3 versões previstas na norma, indício de que o PARF é reaberto sempre que necessário ao longo do exercício de execução, não só nas 3 janelas formais do Art. 12-14.

5.2 Composição da Proposta Orçamentária (POA/PLOA)

- Deve ser **integrada e compatível** com o PPA e a LDO, observando o Manual Técnico de Orçamento — MTO (Art. 7º, §1º-§3º).
- Para despesas de custeio da atividade-fim, observa séries históricas; para despesas administrativas, busca racionalizar recursos em favor da área finalística (Art. 9º).
- Considera, além do PARF e do PCA, a **previsão de receitas a arrecadar**, informada por DESEG (taxas de vistoria/perícia/multas), DIGEP (emissão de identidades), CEMEV (alienação de viaturas/ equipamentos) e DICOA (permissionários, concessionários, multas contratuais) (Art. 10).
- Reservas de contingência da DIOFI e da DISAU podem ser usadas para ajustar pedidos iniciais de compra/contratação dentro do limite alocado; havendo insuficiência, a Diretoria notifica o EMG, que

indica a fonte de cancelamento (Art. 18).

- Na hipótese de a LOA não ser aprovada antes do início do exercício, os Ordenadores de Despesas ficam autorizados a praticar atos essenciais à continuidade das atividades, respeitando a LDO vigente (Art. 16). Os valores da Proposta Orçamentária podem, inclusive, servir para demonstrar previsão orçamentária na fase interna da licitação, se autorizado pelas LDOs federal/distrital (Art. 17).

6. Integração PCA ⇔ PARF ⇔ POA — linha do tempo consolidada de um exercício

Mês (aprox.)	PCA	PARF	POA/PLOA
Jan–Mar	Execução do PCA do ano corrente continua	—	—
Até 1º/abr	Requisitantes enviam demandas (DFD)	—	—
Até 20/abr	Áreas técnicas consolidam	—	—
Até 30/abr	DEALF consolida e envia ao EMG	Relatório de execução orçamentária do ano anterior (DIOFI/DISAU)	—
1ª quinzena/mai	Comandante-Geral aprova o PCA	Elaboração do PARF já se inicia com base no PCA aprovado	—
Jun	—	1ª versão do PARF enviada até 15/jun	SELOF inicia elaboração da Proposta com base na 1ª versão do PARF
Jul	Relatórios de risco começam (bimestral)	—	Reuniões técnicas / cronograma da LOA
Set–Nov	Janela de revisão do PCA (15/set–15/nov)	Após definição do teto orçamentário: 2ª versão do PARF (+30 dias)	Fechamento e envio da Proposta ao Comandante-Geral
Após publicação da LOA	Quinzena seguinte: adequação do PCA ao orçamento aprovado	3ª versão do PARF (+10 dias após LOA)	LOA sancionada consolida o ciclo
Ao longo do ano seguinte	Execução das contratações do novo PCA (180 dias de antecedência)	Reavaliações periódicas / versões adicionais (ex.: 4ª versão, Portaria 34/2025)	Execução orçamentária

7. Artefatos e sistemas hoje envolvidos

Artefato/Sistema	Papel no processo
DFD (Documento de Formalização de Demanda)	Formaliza a necessidade do requisitante; base do PCA (Art. 4º, VIII, Portaria 18)
ETP (Estudo Técnico Preliminar)	Primeira etapa do planejamento da contratação; deve demonstrar o alinhamento com o PCA (Art. 19, Portaria 18)
TR / Projeto Básico	Elaborado pela DIMAT após correção de inconsistências, antecede o envio à DICOA (Art. 23, § único)
PGC (Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações)	Plataforma do Siasg/Ministério da Economia para elaborar e acompanhar o PCA (Art. 4º, XX)
SEI	Tramitação processual das portarias e dos processos administrativos (referenciado nos processos SEI de cada portaria)
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)	Divulgação pública do PCA e do PARF quando há acesso ao PGC (Art. 15, § único, Portaria 18; Art. 17, § único, Portaria 17)
Planilha de consolidação (Excel)	Evidenciada no anexo da Portaria nº 34/2025 (Suplemento 204): a consolidação final de demandas de custeio/investimento por órgão setorial — com milhares de linhas, natureza de despesa, quantidade, valor unitário/total e "prioridade" calculada por matriz GUT — é hoje feita e publicada em planilha eletrônica , não em sistema estruturado

8. Pontos de atenção observados no AS-IS

Estas observações não fazem parte das normas — são inferências da leitura conjunta dos três documentos, relevantes para quem for desenhar o TO-BE:

- **Consolidação manual em planilha:** a "Planilha das demandas de aquisições e contratações" anexa à Portaria nº 34/2025 lista milhares de itens por órgão setorial (AJGER, APROS, CEMEV, CESMA, COMOP, DESEG, DIMAT, DIREN, DIREP, DISAU, DITIC etc.), cada um com valor unitário, quantidade, total acumulado e prioridade — calculada por uma matriz GUT (Gravidade × Urgência × Tendência × Maturidade do Processo) aplicada de forma **não padronizada entre setoriais** (o próprio rodapé da planilha explica a fórmula, indicando que cada setorial a replica manualmente).
- **PARF com mais versões do que a norma prevê:** a Portaria nº 17/2025 formaliza apenas 3 versões do PARF (Art. 12-14), mas a Portaria nº 34/2025 aprova uma **4ª versão** — sinal de que, na prática, o PARF é reaberto sempre que necessário ao longo da execução, sem uma janela formal específica para isso.
- **Prazo de 180 dias como restrição crítica:** a antecedência mínima de 180 dias entre a formalização do processo de contratação e a data estimada de aquisição (Art. 20, §3º, Portaria 18) é apertada frente ao volume de itens observado na planilha de demandas — um indicador de onde o rastreamento de prazos/alertas é mais necessário.
- **Múltiplos elos de dependência entre setores:** o fluxo depende de informações vindas de DIGEP, DINAP, DIOFI, DISAU, DESEG e CEMEV em momentos específicos (Art. 6º, §2º e Art. 10, Portaria 17), o que cria pontos de sincronização manual sujeitos a atraso.

- **Ausência de sistema único citado nas normas:** as portarias mencionam o PGC/Siasg e o SEI, mas não descrevem um sistema interno do CBMDF para orquestrar o fluxo requisitante → área técnica → DEALF → EMG → Comandante-Geral — hoje esse fluxo parece se apoiar em documentos padronizados e processos SEI, sem uma ferramenta de acompanhamento único.
